



جدول تقدم المشاريع بولاية سوسة



الوضعية	القطاع	ر/ع	بيان المشروع	المعتمدة	المكونات	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	سنة الإدراج	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الإنجاز	الإشراف	تقدم الأشغال%	الملاحظات
أكودة	رياضة	1	هيئة الملعب البلدي بأكودة S.P.C.F (58324516)	أكودة(1)	تهيئة 04 حجرات الملايس	350	661,645,950	2019	12/10/2022	180 يوم	بلدية أكودة	100%	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية APD بم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 04/05/2021 على مستوى المصادقة على تقرير فرز العروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 12/10/2022(استكمال الاعتمادات بتمويل بلدي) تم القبول الوقي بتاريخ 27/6/2023

جملة الاعتمادات 661,645,951

الزاوية القصيبة والثرثيات (2)	مناجزة	شباب	2	تهيمة دار الشباب الزاوية القصيبة والثرثيات شركة أروى للمقاولات	الزاوية القصيبة الثرثيات(2)	تهينة عامة	100	100	2020	07/02/2022	90 يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال(اتمام الجزء الأول والشروع في الجزء الثاني)/تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 17/4/2023
	2025	رياضة	3	تشيب الملعب القدم بزواوية سوسة	تشيب اصطناعي	*	*	2025	*	*	*	*	*	تم النظر في الدراسة التمهيدية APS بتاريخ 24/07/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة.تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وجاري تعديل الدراسة

جملة الاعتمادات 800

القلعة الصغرى(4)	مناجزة	شباب	4	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب شركة (23861550)ATM travaux/clean service	القلعة الصغرى(4)	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العب+فضاء رياضي	350	169259,550 فضاء رياضي 248,222,100 للتهيئة	2019	07/06/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 10/07/2020 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/10/2020 (أول غير مجدي) تم القبول الوقي للاشغال(08/02/2022 لغسط و 22/09/2022 قسط 2)
	2025			تعشيب الملعب البلدي القديم بالقلعة الصغرى		تعشيب اصطناعي	700	*	*	2025	*	تم النظر في الدراسة التمهيدية APS بتاريخ 19/08/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة.تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وجاري تعديل الدراسة		
	مناجزة			تهمة الملعب البلدي بالقلعة الصغرى مقاولات نور الدين الصغير		انارة واتمام سياج	300	440,437	2016	12/02/2019	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 5/5/2018 انطلقت الأشغال بتاريخ 12/2/2019/تم قبول الأشغال
	مناجزة			تهمة قاعة ألعاب فردية بالقلعة الصغرى شركة حامد للبناء		تهيئة دار الشباب القديمة	350	423	2019	15/02/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 01/07/2020 تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 23/11/2021

جملة الاعتمادات 1980,918

القلعة الكبرى(4)	دراسات	شباب	8	مواصلة تهيئة دار الشباب القلعة الكبرى	القلعة الكبرى(4)	القسط الثاني من التهيئة	300	*	2024	*	*	*	استكمال برنامج التهيئة/على مستوى تعيين المصممين - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى بلدية القلعة الكبرى بتاريخ 03/07/2025-على مستوى إعداد تقرير اختبار	
	منجز		9	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب SOGETRAM(53411114)		راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العب	270	200	2019	18/05/2021	120 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 22/10/2020 انطلقت الأشغال بتاريخ 27/05/2021 تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 11/04/2023
	منجز		10	تنوير الملعب البلدي بالقلعة الكبرى		انارة للتمارين	222,522,860 Page 1	200	2019	*	120 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 30/03/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثانية تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 24/11/2021

		اضلة	11	اعادة تمشيب الملعب البلدي بالقلمة الكبرى		تمشيب اصطناعي	500	597,323	2018	26/10/2020	150 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	انطلقت الأشغال بتاريخ 26/10/2020 تم القبول الوقتي 13/10/2025 للأشغال(31/08/2022)
جملة الاعتمادات									1389,845					

(9)مجموعته	منجز	شباب	12	مواصلة تهيئة دار الشباب النفيضة	النفيضة(6)	ملعب كرة سلة	50	*	2025	*	*	*	ملعب كرة سلة أرضية خرسانية تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى البلدية بتاريخ 06 ماي 2025	
	منجز		13	تهيئة دار الشباب النفيضة الصحي مقدم للأشغال العامة (97405176) شركة		إضافة قاعات نشاط وتهئية عامة	400	510,201,790	2022	20/05/2024	150 يوم	البلدية	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض/على مستوى عرض تقرير فرز العروض على لجنة الشراءات/يتم استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 20/05/2024 تم القبول الوقي بتاريخ 13/12/2024
	منجز		14	تهيئة دار الشباب النفيضة معز بالليل للمقاولات شركة		تهيئة عامة	150	120,116,220	2016	07/12/2020	90 يوم	بلدية النفيضة	100%	منها 50 إذ لتغطية عجز صفقة الملعب الرياضي تم الاعلان عن الاستشارة تم اعداد اختبار للشبكة الكهربائية تعهدت البلدية خلال جلسة 12/06/2020 باستكمال إجراءات الاستشارة والعمل على انطلاق الأشغال قبل موفى السنة تم القبول الوقي للأشغال
	2025	رياضة	15	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة		إعادة بناء السياج الخارجي	500	*	2025	*	*	*	المساهمة في إعادة بناء السياج الخارجي تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/إجراءات تعيين المصممين	
	منجز		16	إعادة تشييب اصطناعي للملعب البلدي بالنفيضة		تشييب اصطناعي	500	791,171,300	2021	22/01/2024	150 يوم	بلدية النفيضة	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين كما تم تسجيل عديد الاعتراضات بخصوص طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/01/2024 تم القبول الوقي بتاريخ 13/12/2024
	أشغال		17	تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة الوفاء للبناء شركة		حجرات ملابس	350	588,359,800	2020	22/04/2024	180يوم	بلدية النفيضة	98%	على مستوى استكمال إجراءات الربط بالشبكات/
							جملة الاعتمادات		2559,847					

(5)بوفیشة(م	2025	شباب	18	مواصلة تمیئة دار الشباب بوفیشة	بوفیشة(5)	تهیئة القاعة الكبرى والقضاء الرياضي	400	*	2025	*	*	*	*	تهیئة القاعة الكبرى والساحة الخارجية(يتم اعداد تقرير الاختبار)
	أشغال		19	مواصلة تمیئة دار الشباب بوفیشة SOBAROM		تهیئة عامة	50	289,976,392	2015	28/08/2024	180 يوم	بلدية بوفیشة	98%	يشهد صعوبات في الانجاز /على مستوى الدراسة(سيتم دمج الاعتمادات/ تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/09/2020 اخر أجل لقبول العروض 16/10/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة انطلاق الاشغال يوم الجمعة 17 جوان 2022 /تم فسح الصفقة بعد تخلي المقاول للمرة الثانية /تم الاعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 14/01/2024 على مستوى اعداد تقرير فرز العروض /على مستوى استكمال إجراءات الصفقة /انطلقت
	أشغال		20	مواصلة تمیئة دار الشباب بوفیشة SOBAROM		اعتماد إضافي لتهیئة مشروع الجيل الثاني	100		2021		يوم 180			

أشغال	21	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العباب	200	2019	17/06/2022	180 يوم		الأشغال بتاريخ 28/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات القبول الوقي	3/10/2025
	22	تهيئة مركز الاصطياف والتخييم بالسلموم شركة المهني للأشغال		500	2012	03/10/2019	180 يوم	بلدية بوفيشة	100%	على مستوى الأشغال مع التزام البلدية بمراجعة مثال التهيئة تعهدت بلدية المكان خلال جلسة 12/06/2020 على استحداث نسق الإنجاز/تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 30/6/2022
				جملة الاعتمادات				1261,976		

حمام سوسة(5)	منجز	شباب	23	اتمام بناء دار الشباب حمام سوسة المدينة شركة يوسف للبناء	حمام سوسة(5)	150	142,995,184	2019	23/06/2020	110 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقي للأشغال
	منجز		24	تهيئة مركز الإقامة بنار الشباب سهلول مقاولات محمد بالأكل		350	317,544	2012	*	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم فسخ الصفقة وإجراء طلب عروض ثان بسبب اخلال المقاوله بتعهداتها تم الإعلان عن طلب عروض الأشغال المتبقية للمرة الثالثة (غير مثمر) وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة/تمت المصادقة على تقرير فرز العروض على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/ تم الاتفاق مع المقاوله المعنية لاستكمال الأشغال على الإنطلاق يوم 21/09/2021 /تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 04/01/2022
	منجز		25	تهيئة مركز الإقامة بسهلول حلاوة للبناء شركة		500	499,885,891	2019	01/09/2020	120 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقي للأشغال
	منجز	رياضة	26	تنوير الملعب الفرعي بملعب بوعلی الحوار		250	225	2021	07/08/2023	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم الإعلان عن طلب العروض/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاوله عن الشروع في الإنجاز/على مستوى انطلاق الأشغال/على مستوى القبول الوقي للأشغال
	منجز		27	تهيئة قاعة الرياضة بحمام سوسة 3M travaux		150	194,356,750	2021	22/11/2022	95 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	انطلقت الأشغال بتاريخ 22/11/2022/تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 24/02/2023
							جملة الاعتمادات	1379,78					

سوسة الرياض (5)	طلب عروض	شباب	28	تهيئة دار الشباب حي الرياض البركة للمقاولات شركة	سوسة الرياض (5)	200	العزل الصوتي للقاعة الكبرى	363,478,360	2024	11/07/2025	150 يوم	بلدية سوسة	30%	اعتماد إضافي لبرنامج 2020/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى فتح الاعتمادات .,انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025				
	طلب عروض					200	عزل صوتي		2020					تم الإعلان عن استشارة لاختيار مكتب دراسات مختص في العزل الصوتي للقاعة الكبرى على مستوى تنقيح الدراسة التفصيليةAPD واعداد ملف طلب العروض/تم اعداد دراسة في الشبكة الكهربائية تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025				
	دراسات					250	تهيئة عامة وفضاء رياضي		*					2022	*	اج التجهيز	*	تهيئة عامة تم اعداد برنامج التدخل وتمت احالته لمصالح الولاية لتعيين المصممين بعد التوصل ببرنامج التهيئة الخاص بجمعية USAID/في طور المصادقة على الدراسة التفصيلية APD/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض
	دراسات					200			*					2020	*	اج التجهيز	*	

تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول المؤقت 13/10/2022 للاشغال بتاريخ 25/10/2022	100%	بلدية الزهور	120 يوم	30/01/2021	2017	564,646	600	تجشيب اصطناعي		تجشيب ملعب البلدي بالزهور	32	رياضة	منجز
						1414,646	جملة الاعتمادات						

سوسة المدينة(3)	منجز	شباب	33	تهيئة مركز الإقامة بسوسة الشركة المتوسطة للتكييف والبناء و Express gazon	سوسة المدينة(3)	سياج خارجي وفضاء رياضي	350	93,0330+د(فضاء رياضي)	2017	08/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير متمر تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول المؤقت لأشغال السور تم القبول المؤقت لأشغال الفضاء الرياضي
	منجز		34	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشبائي بسوسة مقاولات اسراء (الحبيب عبد السلام)		قسط الاختبار	500	117,422,774	2020	01/09/2022	90يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال تبعا لتقرير اختبار تم في الغرض/تم القبول المؤقت بتاريخ 10/05/2023
	أشغال		35	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشبائي بسوسة مقاولات حلاوة للبناء		تهيئة المطبخ والإقامة		461853,601	2020	23/09/2024	240 يوم	اج تجهيز	98%	تم تعيين المصممين في الأشغال المتبقية بعد إحالة برنامج وظيفي في الغرض لمصالح الولاية على مستوى تنقيح الدراسة حسب ملاحظات إدارة حفظ الصحة/على مستوى إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة/تم فتح العروض بتاريخ 21/02/2023 وعلى مستوى استكمال إجراءات الصفقة/سيتم إعادة التفاوض مع المقاولين بعد تخلي المقاوله صاحبة العرض عن الانجاز /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة/على مستوى انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 23/09/2024-على مستوى رفع التحفظات واستكمال اجراءات القبول المؤقت
	جملة الاعتمادات						1002,275							

تمت إحالة البرنامج الوظيفي لدار الشباب الى بلدية سوسة/تم عقد جلسة مع بلدية سوسة بتاريخ 18/03/2021 وتم الاتفاق على انطلاق الدراسات /تم الاتفاق خلال جلسة 27/01/2025 اعلى أن تقوم البلدية باعادة مراسلةAFH للنظر في امكانية التخفيض في سعر العقار لتخصيصه لبناء دار الشباب	*	بلدية سوسة	*	*	2020	*	70	دراسات	سوسة جوهرة(10)	دراسة بناء دار الشباب سوسة جوهرة	36	تجهيز	مطل	سوسة جوهرة(10)
تم الاعلان عن ملف طلب العروض اخر اجل لقبول العروض 27/2/2018 تم تسليم الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 25 مارس 2019	100%	وزارة التجهيز	720 يوم	25/03/2019	2018	32,14 م د	17000	توسعة الملعب		تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة مقاولات منصف نوار	37	رياضة	منجز	
أشغال الانارة والسبورة اللامعة ومعدات الارسال	100%	وزارة التجهيز	720 يوم	25/03/2019	2021	*	20000	الكهربائية/الحماية ضد الحرائق/منصة الصحفيين/تجهيز		إقام تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة مقاولات منصف نوار	38		أشغال	
ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان	*	وزارة التجهيز	*	*	2024	*	4000	منصة الصحفيين		تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة	39		دراسات	
هذا المشروع ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/07/2025 في مرحلة الفرز الفني للعروض	*	وزارة التجهيز والإسكان	*	*	2025	*	12000	اقتناء وتركيز كراسي		تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة	40		2025	
يتم تحديد برنامج التدخل/تم تعيين المصممين	*	بلدية سوسة	*	*	2023	*	300	تهيئة عامة		تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة	41		دراسات	
تم القبول المؤقت للأشغال بتاريخ 10/10/2022	100%	اج تجهيز	90 يوم	*	2014	62,754,650	100	تهيئة ملاعب كرة اليد وتصريف مياه الأمطار		تهيئة الفضاءات الرياضية بنواة معهد 02 مارس 1934 قسط ثاني(مقاولات بالرزوقة)	42		منجز	

13/10/2025	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة/انطلقت الأشغال/تم القبول المؤقتي للأشغال بتاريخ 20/08/2023	100%	اج تجهيز	90 يوم	*	2020	169,212,08	100	تهيئة عامة		43	<div> <div> </div> <div> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> </div> </div>												

3/10/2025	03/10/2017	تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/03/2019 تم القبول الوقتي للأشغال(ماي انطلقت الاشغال بتاريخ 2024)	100%	وزارة التجهيز	540 يوم	15/03/2019	2015	13,5	5000	مسيح أولمبي		مقاولات	44	بناء مسيح مغطى بسوسة بن عربية	منجز	
						15/03/2019	2017		1000	مقاولات		45	بناء مسيح مغطى بسوسة بن عربية			
								82241,966	جملة الاعتمادات							

سوسيه سيدي عبد الحميد(3)	2025	معتل	رياضة	46	تهيئة قاعة سويس	سوسة سيدي عبد الحميد(3)	تهيئة عامة	400	*	2025	*	*	*	*	تهيئة عامة	
				47	تأهيل الملعب المعشب للرقبي بالعوينات		تعشيب اصطناعي	250	*	2011	*	*	*	سيتم طلب اجتماع مع بلدية سوسة حول تعطل المشروع /تم عقد جلسة لفض الاشكال وتم الاتفاق على صياغة مقترح وعرضه على المصالح المركزية للوزارة		
				48	بناء قاعة ملاكمة بالعوينات شركة فرح للبناء SOFAB		*	800	829	2018	08/07/2019	360 يوم	بلدية سوسة	100%	انطلقت الأشغال-تم استئناف الأشغال بعد فتح الاعتمادات وخلص المقاول /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 17/02/2023(تم توفير 57 أد من طرف الوزارة لاستكمال بعض الأشغال الإضافية)	
													جملة الاعتمادات		1536	

تاريخ التسليم														
ممثل	تجهيز	49	تهيئة دار الشباب سيدي الهاني	سيدي الهاني(3)	احداث فضاء رياضي وسياج خارجي	100	*	2014	*	*	اج تجهيز	*	سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة بعد تخلي المقابلة عن الإنجاز والقيام بإجراءات فسح العقد/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 13/03/2024(طلب عروض غير مجدي)/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/08/2024 /طلب عروض غير مجدي(سيتم اعادة الاعلان عن طلب العروض خلال أوائل شهر مارس)/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 19/3/25 تمت الموافقة على الصفقة وفي انتظار فتح الاعتمادات	
طلب عروض	رياضة	50	تهيئة الملعب البلدي بسيدي الهاني E.T.E.G				300	299,628,350	2022	08/07/2025	120 يوم	اج تجهيز	35%	على مستوى اعداد ملف طلب العروض وتعيين مكتب المراقبة/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024(آخر أجل لقبول العروض 23/10/2024)/انطلقت الأشغال بتاريخ 08/07/2025
منجز		51	تعشيب ملعب سيدي الهاني		انارة للتمارين	600	582,195,800	2019	07/03/2022	150 يوم	بلدية سيدي الهاني	100%	تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي قصد اعداد مثال الرفع الطبوغرافي وتم تعيين المصمم على مستوى استكمال الدراسة تتم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 27/04/2021 /انطلقت الأشغال بتاريخ 8/8/2023(تم القبول الوقتي بتاريخ 7/3/2022)	
					جملة الاعتمادات		982,195							


نوع النشاط	أشغال	تأجيل	53	تهيئة دار الشباب سيدي بوعلي	سيدي بوعلي(3)	تهيئة عامة	150	345,151	2022	11/11/2024	150 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى الإعلان عن ملف طلب العروض/تم اصدار استشارة للقيام باختبار فني/على مستوى تنقيح ملف طلب العروض تبعا لتقرير الاختبار/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/02/2024 على مستوى استكمال اجراء الصفقة/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/11/2024/على مستوى القبول الوقتي للأشغال
				أشغال		54	مواصلة تهيئة دار الشباب سيدي بوعلي مقاولات الريادة		تهيئة عامة					
	منجز	رياضة	52	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بوعلي شركة بودية للأشغال E.B.T.S		انارة للتمارين	300	307306,875	2022	14/02/2024	120 يوم	البلدية	100%	تم اعداد الدراسة سابقا ويتم تحيينها والاعلان عن طلب العروض/على مستوى المصادقة على الصفقة/تم اسناد الاذن الإداري بإطلاق الأشغال بتاريخ 14/02/2024 تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 05/06/2024
				جملة الاعتمادات					652,457					

شط مرم(1)	دراسات	رياضة	55	انجاز ملعب حي بلدية شط مرم	شط مرم(1)	ملعب حي	200	*	2022	*	*	*	اج تجهيز	*	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة/على مستوى المصادقة على الملف الفني للعقار	3/10/2025
						جملة الاعتمادات		200								
قرويط هيشر (1)	دراسات	رياضة	56	تهيئة ملعب حي عين القارسي بلدية قرويط هيشر	قرويط هيشر (1)	تهيئة عامة	150	*	2022	*	*	*	اج تجهيز	*	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة	
						جملة الاعتمادات		150								
كامل الولاية(1)	دراسات	رياضة	57	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الاحياء تهيئة 4 ملاعب احياء	كامل الولاية(1)	*	200	*	2013	*	*	*	اج تجهيز	25%	على مستوى القبول الوقتي بخصوص ملعب حي بالمسعين وعلى مستوى الدراسة لبقية الملاعب تمت مراسلة الولاية لاحالة اعتمادات ملعب حي الى بلدية سوسة/على مستوى اعداد مثال اشغال مختلفة لملاعب حي باولاد عبد الله بالنفيضة/سيتم تحديد الملعب الرابع	
						جملة الاعتمادات		200								
كندار(2)	طلب عروض	شباب	58	تهيئة دار الشباب كندار	كندار(2)	تسييج الملاعب تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة عامة	150	406	2024	*	*	*	اج تجهيز	*	اعتماد اضافي لبرنامج 2019/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة	
			59	تهيئة دار الشباب كندار			200		2019							
						جملة الاعتمادات		350								
(7)	دراسات	شباب	66	تهيئة دار الشباب بمساكن		تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	*	بلدية مساكن	*	تم الإعلان عن استشارة للقيام باختبار واعداد الدراسات/على مستوى المصادقة على تقرير الاختبار/تمت المصادقة على تقرير الاختبار وسيتم تعيين المصممين	
	منجز		65	تهيئة دار الشباب الكنائس شركة الياس الغربي للمقاولات		تهيئة عامة	200	140,925,750	2020	16/05/2022	120 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الاختبار/انطلقت الأشغال/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/3/2023		
	أشغال		60	تهيئة ملعب الكنائس شركة التهيئة والبناء/شركة شوازي للبناء		حجرات ملابس سباح خارجي	200	228.287.220 (161)	2013	2(18/11/2024) 0/07/2018	180 يوم	اج تجهيز	100%	يشهد صعوبات /تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 6/3/2018 (بعد فض الاشكال العقاري للملعب)/تم فسخ عقد المقابلة لعدم تمكنها من استكمال باقي الأشغال /تم الإعلان عن استشارة في الأشغال المتبقية بتاريخ 12/06/2023 بقيمة 160,842د.تمت مراسلة الوزارة لامكانية توفير فارق الاعتمادات وانطلاق الأشغال/سيتم اعادة الاعلان عن استشارة استكمال الأشغال بعد تعذر توفر الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف/انطلقت أشغال استكمال التهيئة بتاريخ 18/11/24/على مستوى القبول الوقتي		

61	مهيئة الملعب البلدي بالكنائس الكهرباء المصري 23289887	شركة	مساكن(7)	انارة للتمارين	300	397,491,598	2023	01/02/2025	150 يوم	بلدية مساكن	85%	على مستوى تنفيذ الدراسة التفصيلية APD/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/02/2024/على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى استكمال اجراءات الصفقة بعد تعهد البلدية والوزارة بتوفير فارق الاعتمادات /على مستوى انطلاق الاشغال/انطلاق الاشغال بتاريخ 01/02/2025/تمت عقد جلسة للنظر في أسباب تأخير انطلاق الاشغال - الاشغال اصبحت حثيثة -على مستوى الربط بشبكة الكهرباء للمحول
----	---	------	----------	----------------	-----	-------------	------	------------	---------	-------------	-----	---

رقم	64	تشبيب اصطناعي للمعب الكنايس	تشبيب اصطناعي وسياج داخلي	600	1085	2021	09/08/2023	120 يوم	بلدية مساكن	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 09/08/2023 القبول الوقي للأشغال بتاريخ 21/10/2024
رقم	62	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن	دراسات	50	*	2020	*	*	بلدية مساكن	100%	تم اعداد مثال الرفع الطوبوغرافي تم الإعلان عن مناظرة الهندسة المعمارية(23/12/2020 اخر أجل لقبول التصورات) تم الإعلان عن ملف طلب العروض
رقم	63	بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن الاصطلاح للبناء	شركة قاعة ألعاب فردية	900	1142896,23	2021	03/11/2022	240 يوم	بلدية مساكن	100%	انطلقت الأشغال(مساهمة البلدية) (50535,230)/تم القبول الوقي للاشغال بتاريخ 29/8/2023
جملة الاعتمادات				3474,108							

هرقلة(5)	مبنى	تجهيز	71	مواصلة احداث مركز للتخيم والاصطياف بهرقلة) دمج المركز مع دار الشباب وفتح المركب الشبائي بهرقلة) شركة الأفق الجديد للبناء	هرقلة(5)	تهيئة اخرجية الربط بالشبكات واحداث فضار رياضي	150+50	104993,700 150546,375	2012	23/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100% للتهيئة 100% للملعب الرياضي	تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 20/05/2019 انطلقت الأشغال (قسط هندسة مدنية)انطلقت أشغال الملعب الرياضي تم القبول الوقي للاشغال(22/01/2021)
			67	تهيئة دار الشباب هرقلة		تهيئة دار الشباب القديمة	500	*	2024	*	*	اج تجهيز	*	تبعاً لتقرير اختبار ولزيارة السيد وزير الشباب والرياضة /تم اعداد برنامج وظيفي واحالته لمصالح ولاية سوسة قصد تعيين المصممين/تم تعيين المصممين وتمت المصادقة على التعيين من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية
			68	مواصلة تهيئة مركز الاصطياف والتخيم بهرقلة		اعادة بناء دار شباب	500	*	2025	*	*	*	*	
	رياضة	مبنى	69	تشبيب الملعب البلادي بهرقلة		تشبيب اصطناعي	600	509,34	2018	17/01/2021	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 22/10/2019 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 19/5/2020..تم فتح العروض بتاريخ 26/06/2020 على مستوى إعادة عرض تقريرفرز العروض على أنظار لجنة الصفقات تم اسناد الأذن الإداري/ تم القبول الوقي للاشغال بتاريخ 13/01/2023
		مبنى	70	تنوير الملعب البلادي بهرقلة E.T.E.G (29760811)		انارة للتمارين	250	309	2020	20/04/2022	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تمت إحالة البرنامج الوظيفي للبلدية تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 04/02/2021 تم القبول الوقي للاشغال بتاريخ 13/1/2023
							جملة الاعتمادات	1073,879						

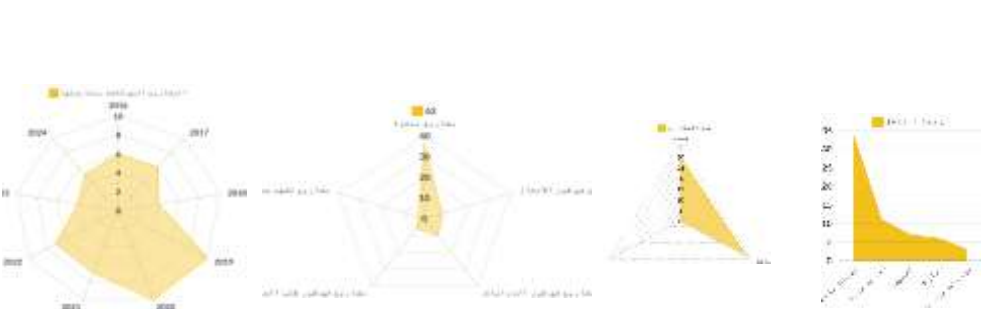

عدد	المستوى	الإنجاز المالي	النسبة
34	منجز	62,134	74,99%
7	أشغال	15,008	18,11%
19	دراسات	2,57	3,10%
10	طلب عروض	2,889	3,50%
1	معطل	0,25	0,30%
71		82,851	100,00%
الجملة			

نوع التدخل	عدد المشاريع	القطاع	عدد المشاريع
تهيئة عامة	39	الشباب	33
احداث جديد	12	الرياضة	38
تشبيب	9		
انارة	6		
جيل ثاني	(3مؤسسات)		
الجملة	71		

سنة الادراج	عدد المشاريع
2011	1
2012	3
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	3
2018	4
2019	10
2020	11
2021	7
2022	7
2023	4
2024	5
2025	8
